


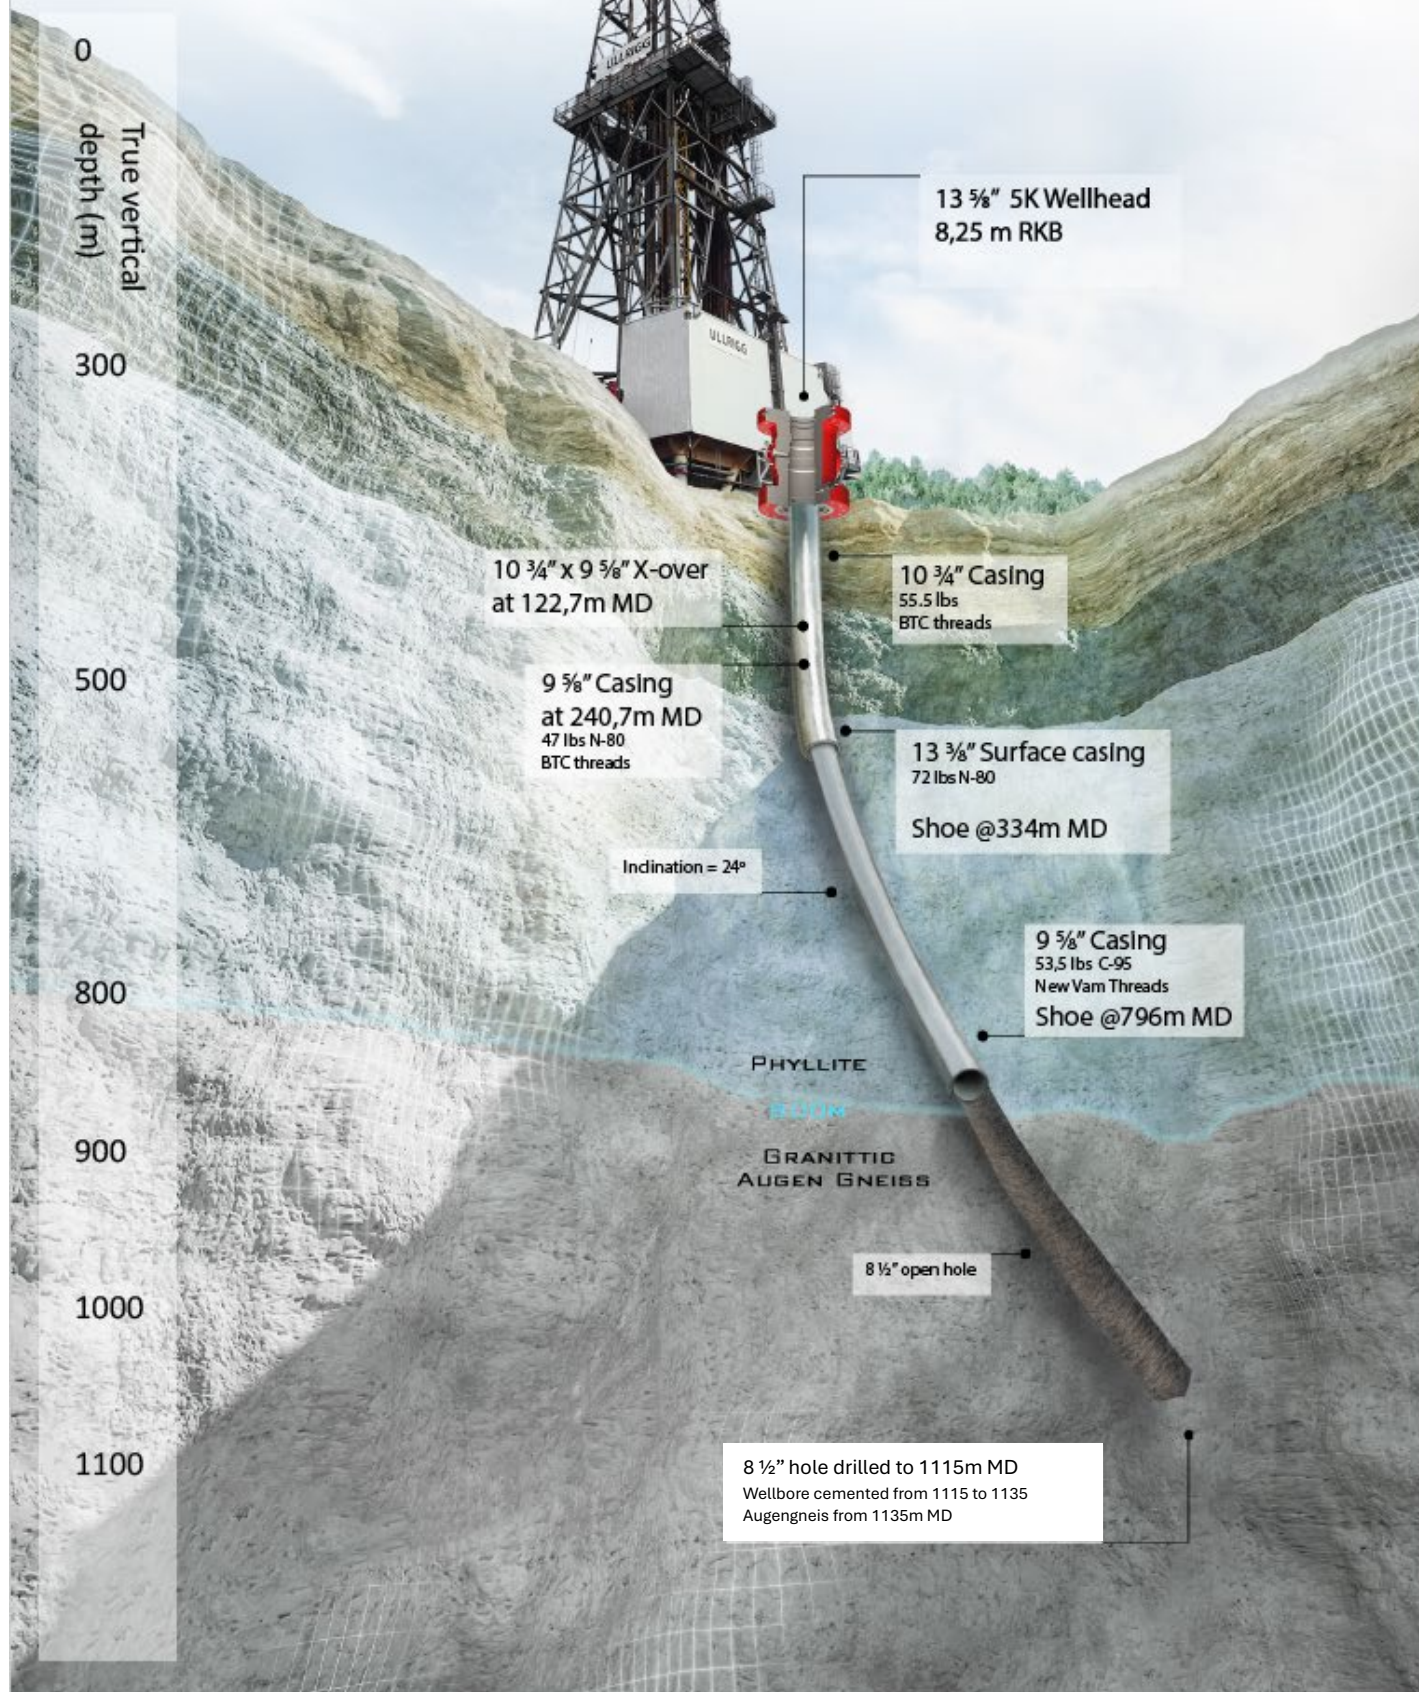

For further information, please contact:

Rev. 1.3

Kristian Vik
Per Simensen

Project Manager
Senior Project Manager

+47 51 87 54 56
+47 51 87 52 81

E-mail: krvi@norcerearch.no
E-mail: pesi@norcerearch.no

SURVEY DATA (SINGEL SHOT) WELL U3

AHD (M)	INC (DEG)	AZ (DEG)	TVD (M)	N-S (M)	E-W (M)
0,00	0,00	0,00	0,00	-13,18	10,82
50,00	1,71	169,95	49,99	-13,84	10,93
100,00	4,41	169,43	99,92	-16,44	11,34
150,00	7,15	165,95	149,66	-21,38	12,54
200,00	8,35	166,21	199,20	-27,94	14,13
250,00	8,75	166,97	248,61	-35,39	15,90
300,00	8,74	168,22	298,06	-42,59	17,50
350,00	10,68	168,21	347,40	-50,52	19,03
400,00	15,77	170,54	396,11	-61,55	21,05
450,00	20,32	169,07	443,58	-76,98	23,72
500,00	22,90	166,50	489,88	-95,37	27,98
550,00	22,19	168,20	536,06	-114,05	32,26
600,00	21,95	170,03	582,44	-132,39	35,83
650,00	22,15	170,18	628,77	-150,93	38,90
700,00	22,28	170,90	675,09	-169,47	42,15
750,00	23,40	173,42	721,05	-188,99	44,74
800,00	23,70	174,70	766,83	209,00	46,70
914	18,2	175			
985	17,5	178			
1005	17,5	180			
1022	16,5	179			
1051	16,3	171	1004	-290,03	52,92
1082	20,5	167	1034	-299,74	54,85

Det er millet 2 hull i casingen på dybde:

Dybde#1; 695.8 mMD – 697,0 mMD. 1.2m langt bekreftet vindu (3 ¾”), high side.

Dybde#2; 742,2mMD – 744.2 mMD. Delvis vindu (3 ½” størrelse). Vindu er på high side.

Unøyaktighet på dyp hvor milling har pågått; +-2,0 m.

Brønnens azimut; 174,7 grader.
